


## Checkliste Rohbau-Abnahme für Schiebetürelement sonor-slide

Bitte für jedes Türelement vollständig ausfüllen und an den Sachbearbeiter zurücksenden. Nur wenn jeder Check o.k. ist und alle Aufmaße eingetragen sind, kann der Auftrag weiter bearbeitet werden!

Auftragsnummer: \_\_\_\_\_ Kunde: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_ Türnummer: \_\_\_\_\_ Pos.: \_\_\_\_\_

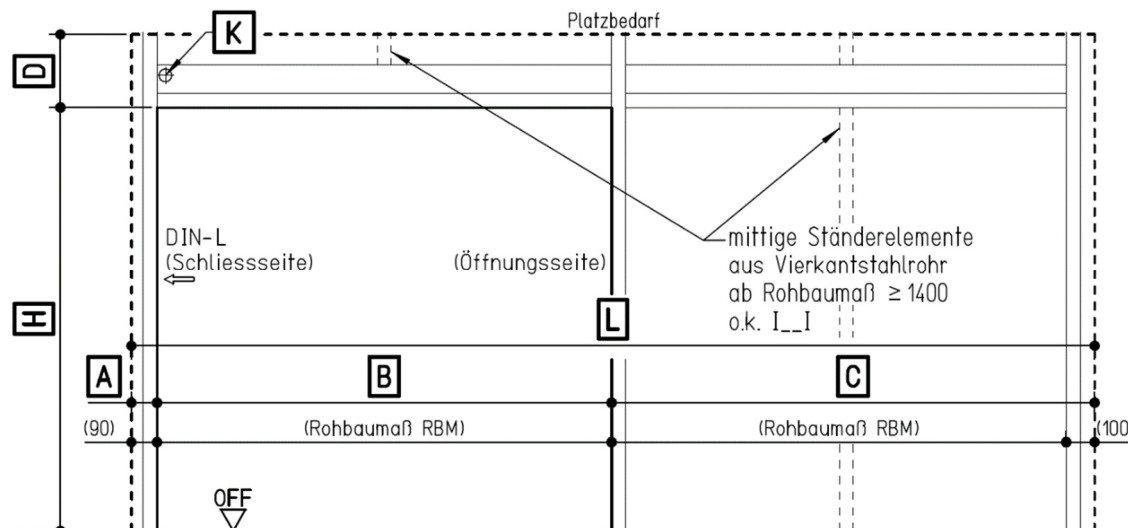

Name: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Rufnummer: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Hinweise	Check o.k. <input checked="" type="checkbox"/>
DIN-L (dargestellt), DIN-R (spiegelbildlich)	<input type="checkbox"/>
Kabelausgang K immer links	<input type="checkbox"/>
Vierkantstahlrohre ausgestaffert um den Schalldurchgang zu vermindern	<input type="checkbox"/>
Je nach Abstandmaß der Vierkantstahlrohre mit weiteren Trockenbauprofilen ausstatten	<input type="checkbox"/>

Maß	Beschreibung	Check o.k. <input checked="" type="checkbox"/> / Aufmaß	Bemerkungen
BxH	Rohbaumaß RBM (Breite x Höhe)	x mm	
A	Überstand ab Leibung-RBM Schließseite (in DIN-Richtung): 90 mm	<input type="checkbox"/>	
C	Überstand ab Leibung-RBM Öffnungsseite (gegen DIN-Richtung): RBM + 100 mm	mm	
D	Überstand ab Leibung-RBM/Sturz oben: Handantrieb 157 mm / Automatantrieb 192 mm	<input type="checkbox"/>	
L	Gesamtlänge (Blende inkl. Stirnabdeckungen): 90 mm + 2x RBM + 100 mm	mm	
	Fußbodengenauigkeit (OFF) über Gesamtlänge: +/- 2 mm	<input type="checkbox"/>	
	Ständerwerk nach Fertigungsanweisung	<input type="checkbox"/>	
K	Kabelverlegung nach Kabelplan/Fertigungsanweisung; Kabelüberlänge ≥ 2000 mm	<input type="checkbox"/>	
